


月間工事工程表 R7.4月版	工事名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和6年6月25日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工事場所	海部郡大治町大字砂子地内		令和9年3月10日				

全体工事進捗状況	工種	令和7年4月																														備考								
		1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水									
<p>50.0%</p> <p>42.5%</p> <p>7.5%</p> <p>■先月迄出来高 ■今月出来高 □未施工出来高</p> <table border="1"> <tr> <td>先月迄出来高</td> <td>38.3%</td> </tr> <tr> <td>今月出来高</td> <td>6.8%</td> </tr> <tr> <td>未施工出来高</td> <td>45.1%</td> </tr> </table>	先月迄出来高	38.3%	今月出来高	6.8%	未施工出来高	45.1%	掘削工・盛土工	盛土						盛土						盛土																				
	先月迄出来高	38.3%																																						
	今月出来高	6.8%																																						
	未施工出来高	45.1%																																						
豊山町(尾張建設事務所)より土砂運搬	土砂搬入						土砂搬入							土砂搬入																										
貯留施設工	壁鉄筋	壁型枠																																						
その他																																								
大型車両搬出入	10tダンプ	60台	60台	60台	60台			60台	60台	60台	60台	生コン5台			60台	60台	60台	60台	60台			60台	生コン20台	60台	60台	60台			60台			60台								

【今月の作業内容】

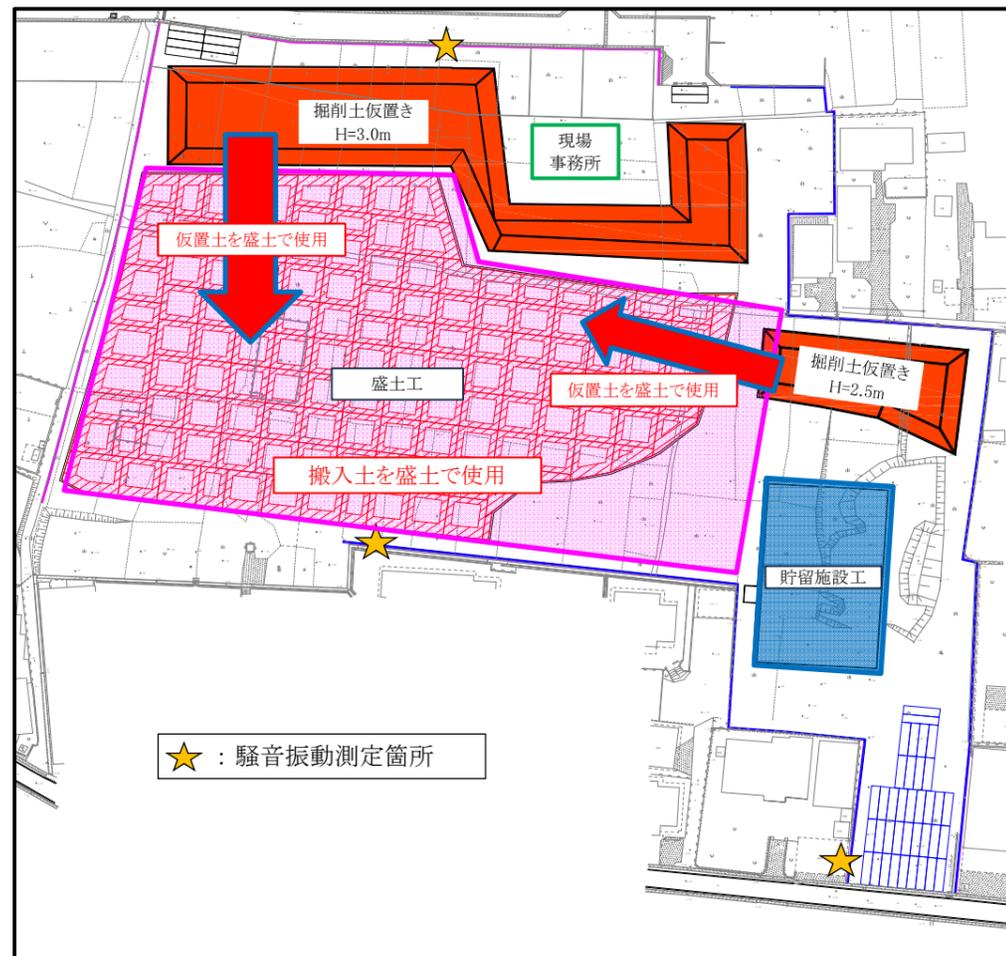

【大型車両搬入ルート】

