


月 間 工 事 工 程 表 R7.5月 版	工 事 名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工 事 場 所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			工種	令和 7 年 5 月																															備考
				1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	
52.9% 45.1% 2.0% 先月迄出来高 今月出来高 未施工出来高			掘削工・盛土工	盛土						盛土																									
			豊山町(尾張建設事務所)より土砂運搬	土砂搬入							土砂搬入																								
先月迄出来高 45.1% 今月出来高 2.0% 未施工出来高 52.9%			貯留施設工																																
先月迄出来高 45.1% 今月出来高 2.0% 未施工出来高 52.9%			その他																																
			大型車両搬出入	10tダンプ 60台 60台							60台 60台 60台				60台 60台 60台 60台 60台																				

【 今月の作業内容 】

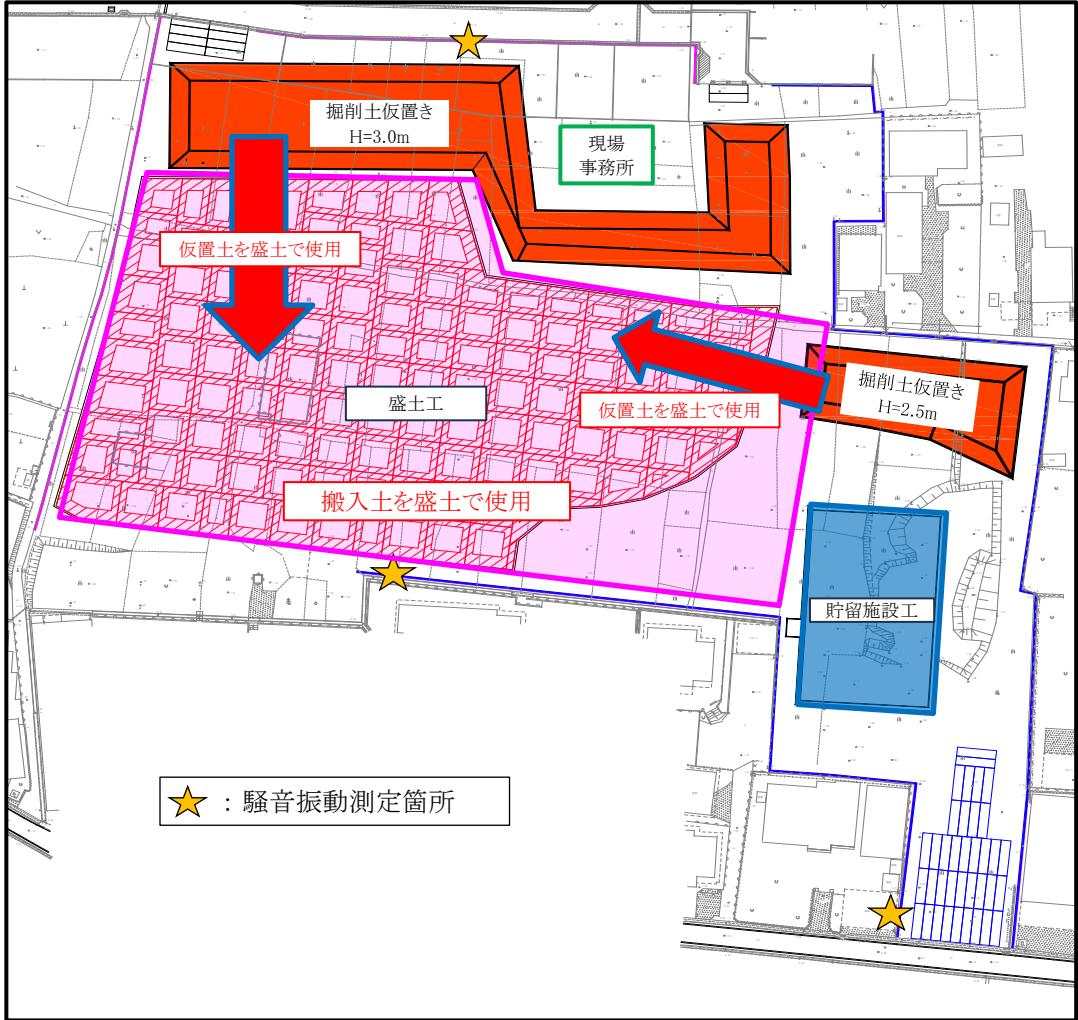

【 大型車両搬入ルート 】

