


月 間 工 事 工 程 表 R7.9月 版	工 事 名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工 事 場 所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			令和 7 年 9 月																																備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1 月	2 火	3 水	4 木	5 金	6 土	7 日	8 月	9 火	10 水	11 木	12 金	13 土	14 日	15 月	16 火	17 水	18 木	19 金	20 土	21 日	22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日	29 月	30 火																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
47.8% 49.0% 3.2% 先月迄出来高 今月出来高 未施工出来高			雨水排水設備工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

【 今月の作業内容 】

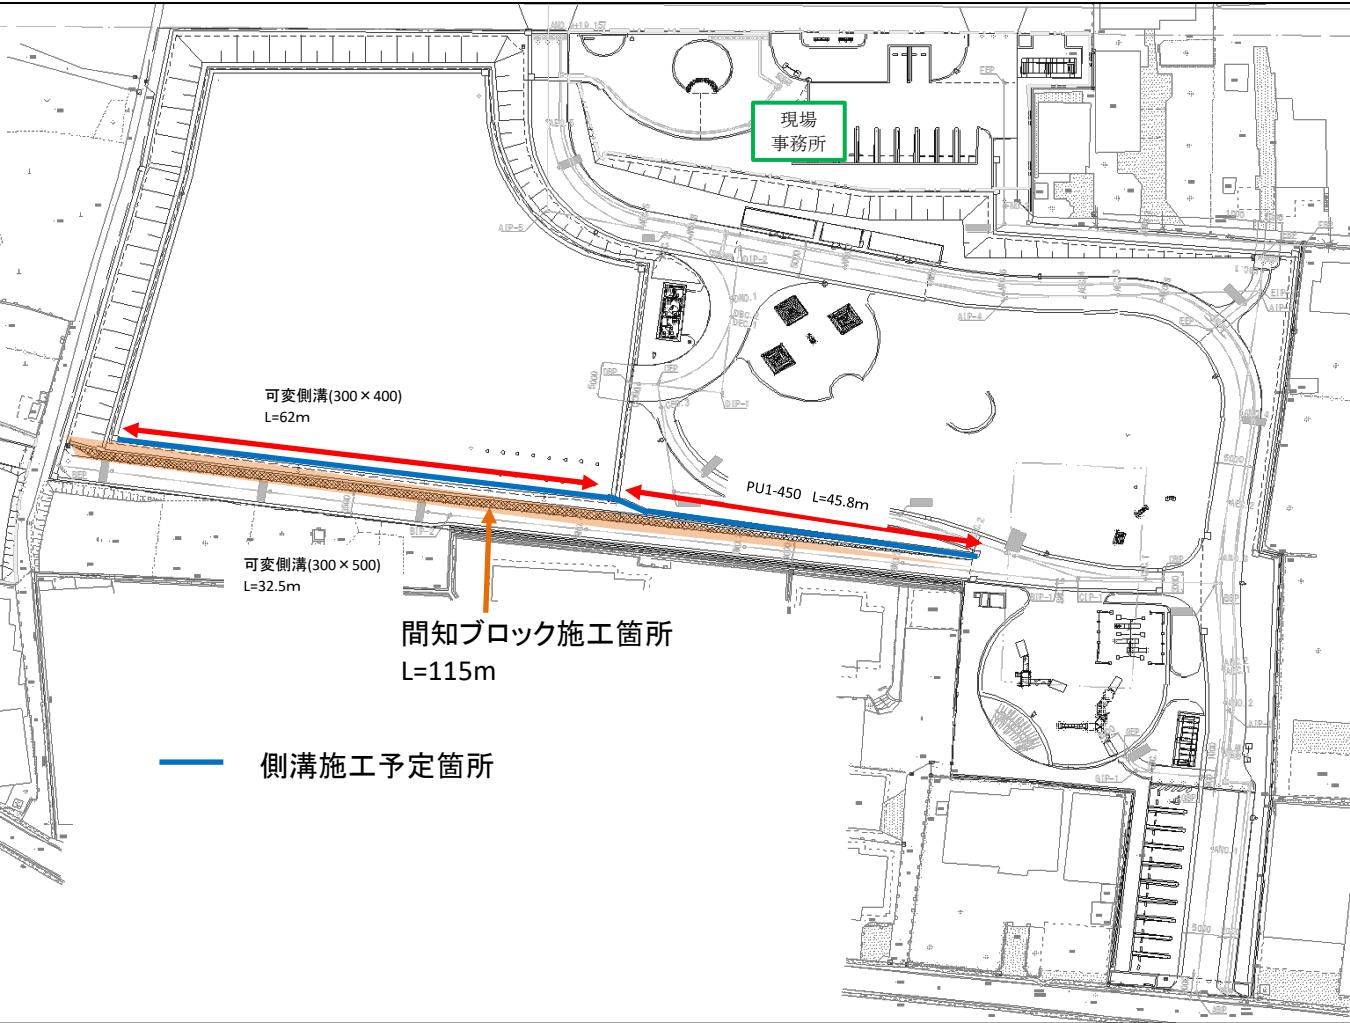

【 大型車両搬入ルート 】

