


月 間 工 事 工 程 表 R8.10月 版	工 事 名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工 事 場 所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			令和 8 年 10 月																															備 考					
			1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土						
9.5% 1.0% 89.5% ■先月迄出来高 ■今月出来高 □未施工出来高			園路広場整備工	地先境界ブロック												南出入口掘削・路盤整正						歩車道境界ブロック																	
			L=171m												A=420m2						L=48.4m																		
			擁壁工													雑割石積み																							
															N=78個																								
			雨水排水設備工																															可変側溝 L=47.2m					
																					自転車置場基礎																		
先月迄出来高 89.5% 今月出来高 1.0% 未施工出来高 9.5%			建築施設整備工																																				
			サービス施設整備工																																				
			残土搬出																																				
									400m3程度 4tDT×2車																														
			搬入予定																																				

【 今月の作業内容 】

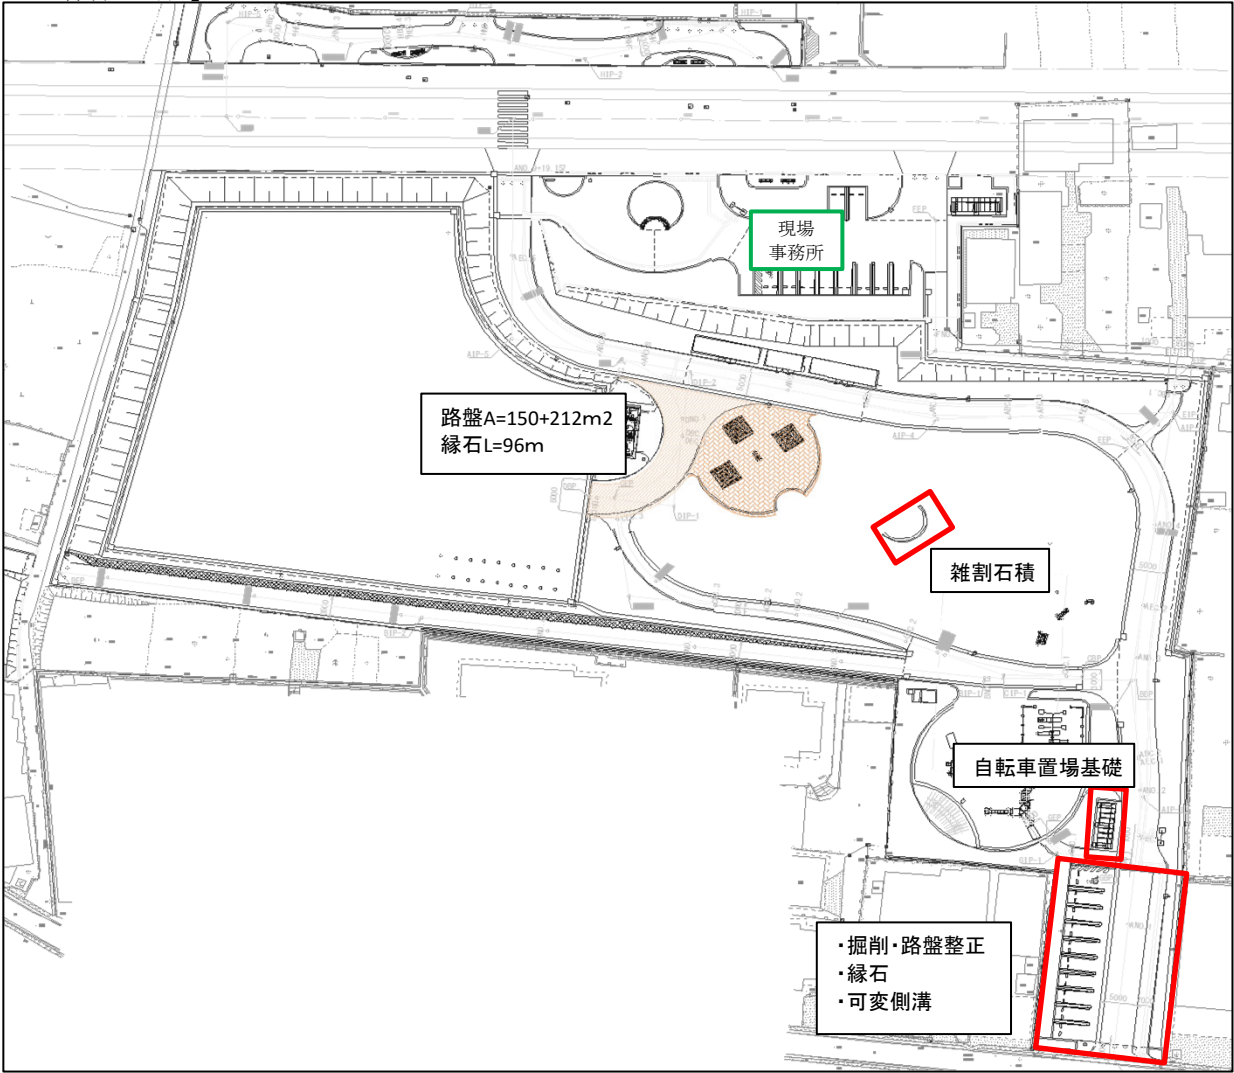

【 大型車両搬入ルート 】

