


月間工事工程表 R8.6月版	工事名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和6年6月25日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工事場所	海部郡大治町大字砂子地内		令和9年3月10日				

全体工事進捗状況	工種	令和8年6月																														備考						
		1月	2火	3水	4木	5金	6土	7日	8月	9火	10水	11木	12金	13土	14日	15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日	29月	30火							
<table border="1"> <tr> <td>先月迄出来高</td> <td>68.0%</td> </tr> <tr> <td>今月出来高</td> <td>3.0%</td> </tr> <tr> <td>未施工出来高</td> <td>29.0%</td> </tr> </table>	先月迄出来高	68.0%	今月出来高	3.0%	未施工出来高	29.0%	園路広場整備工(舗装)																															遊具広場 クレイ舗装路盤A=422m <sup>2</sup> 北側舗装路盤A=332m <sup>2</sup>
	先月迄出来高	68.0%																																				
	今月出来高	3.0%																																				
	未施工出来高	29.0%																																				
	園路広場整備工(緑石)																																北側緑石 L=324.9m					
	遊戯施設・サービス施設整備工																																児童・幼児複合遊具、ブランコ設置					
建築施設整備工																																トイレ・防災倉庫基礎						
給水設備工																																北側 給水設備工 HIVPΦ13 L=61.9m						
雨水排水設備工																																U型側溝 PU3-250 L=22.6m						

【今月の作業内容】

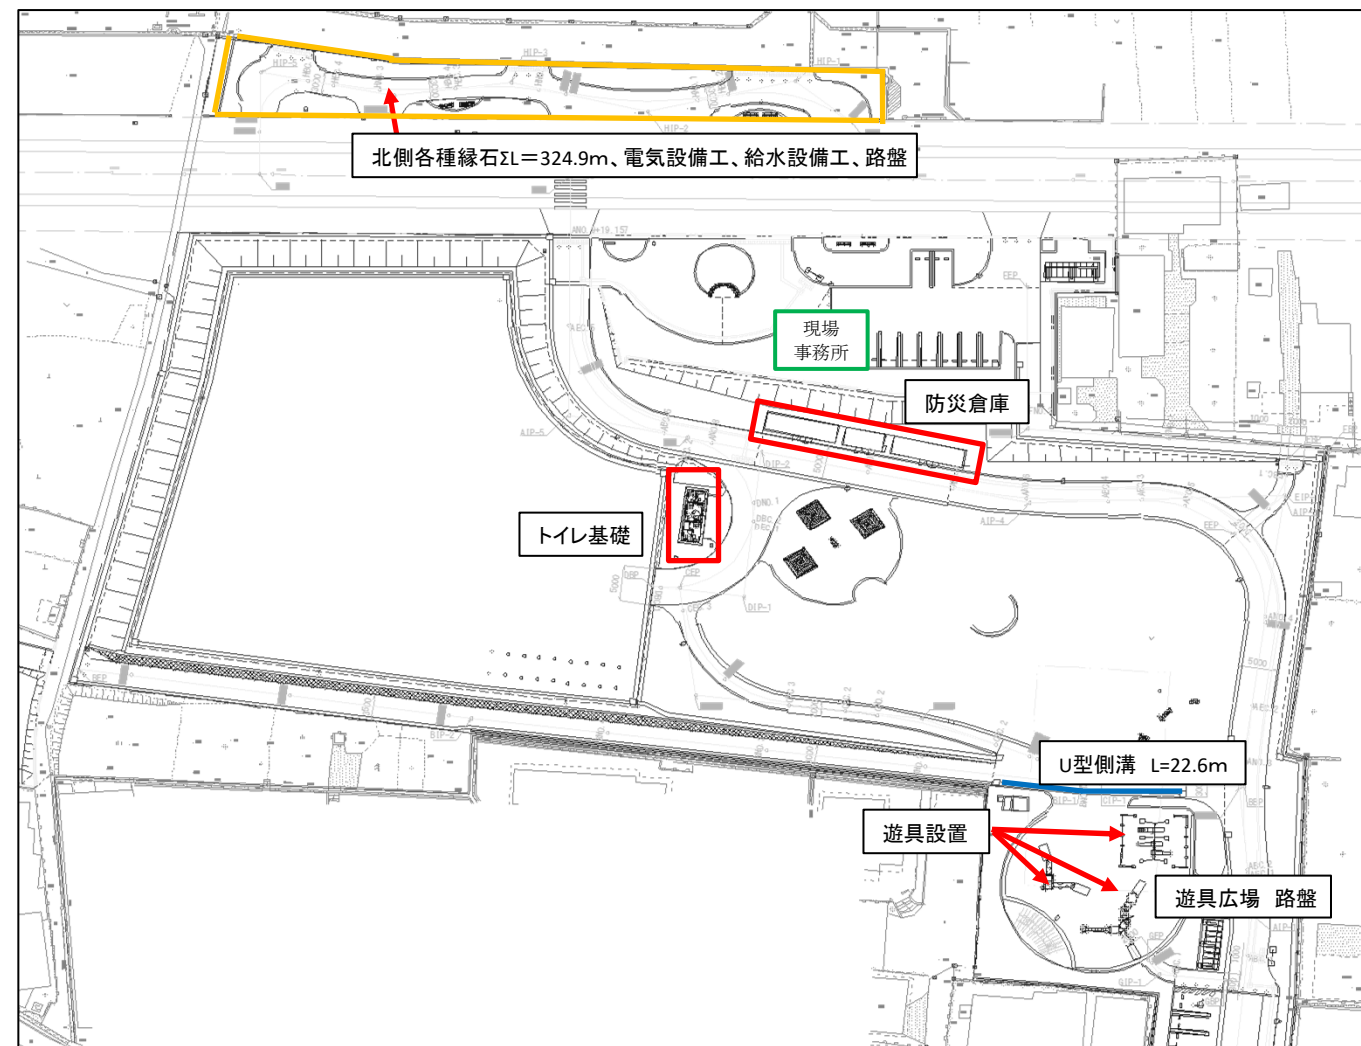

【大型車両搬入ルート】

