


月間工事工程表 R8.7月版	工事名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工事場所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			工 種	令和 8 年 7 月																															備 考	
				1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金		
24.0% 5.0% 71.0% ■先月迄出来高 ■今月出来高 □未施工出来高			雨水貯留施設工					6吋水中ポンプ×2基設置、配管設置																												
			電気設備工																																ハンドホール1基 トイレ裏埋設管	
			汚水排水設備工																															汚水樹N=3か所 VUΦ100 L=11.9m		
			建築施設整備工	トイレ・防災倉庫基礎													生コン打設																			
				鉄筋・型枠組立													V=35m3									脱型				埋戻し						
先月迄出来高 71.0% 今月出来高 5.0% 未施工出来高 24.0%			付帯工											東側町道									西側町道							東西町道						
															舗装撤去A=50.4m2,集水樹4基,VUΦ100 24m								舗装撤去A=102.7m2,路盤							舗装復旧A=41m2+247m2						
			管理施設整備工																																	
			搬入予定												生コン車 9台																					

【 今月の作業内容 】

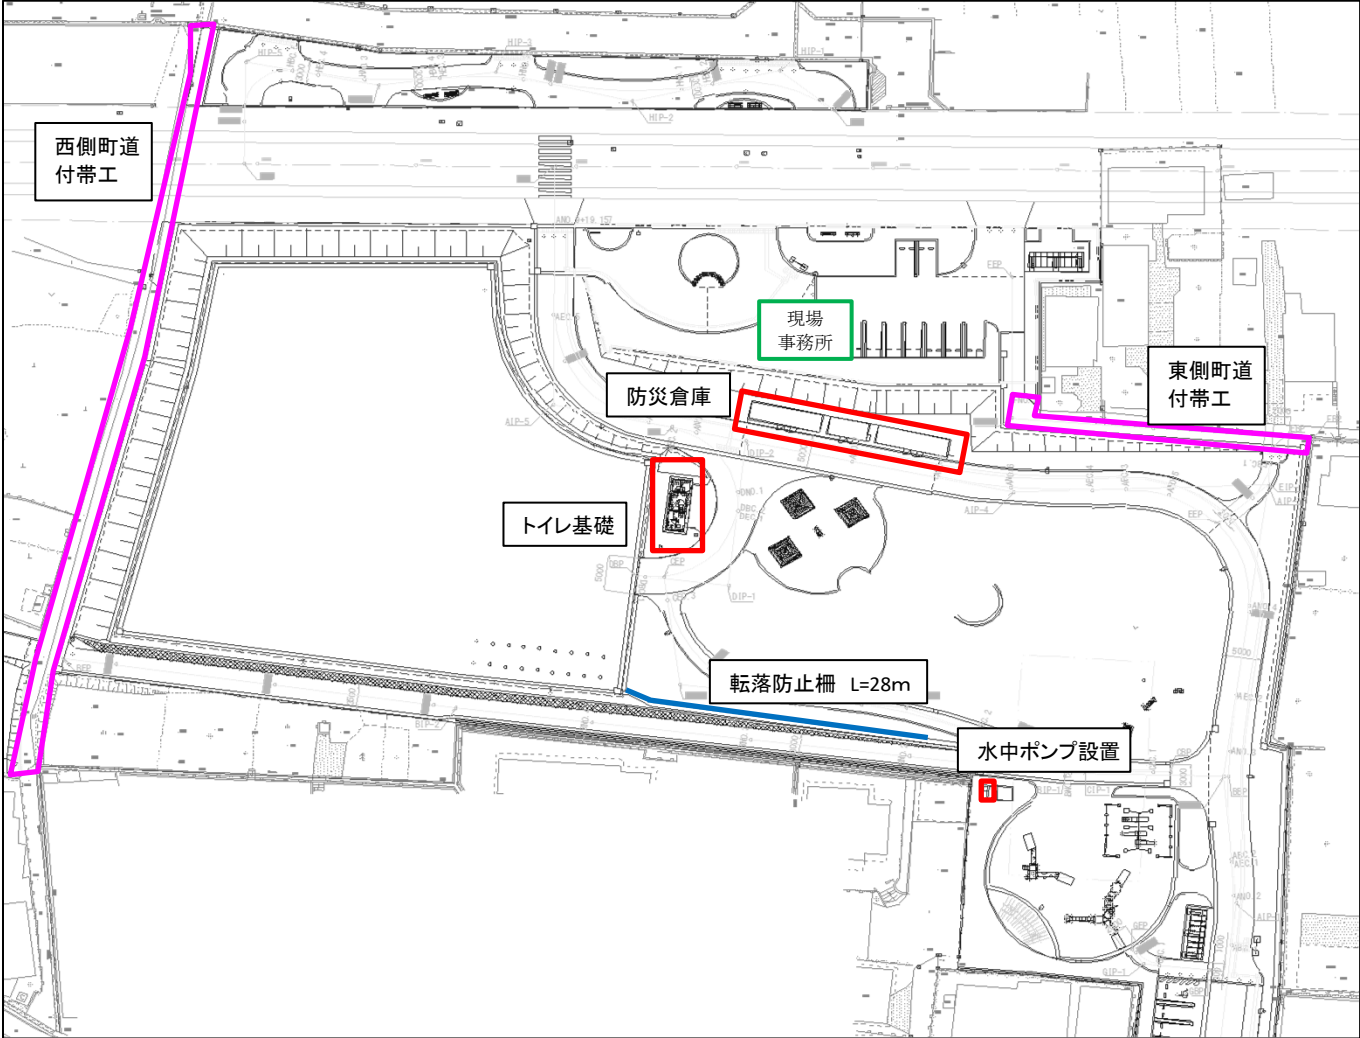

【 大型車両搬入ルート 】

