

月 間 工 事 工 程 表 R8.7月 版	工 事 名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工 事 場 所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			令和 8 年 7 月																															備 考
工 種	1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金			
雨水貯留施設工													6吋水中ポンプ×2基設置、配管設置																					
電気設備工																																		
汚水排水設備工 雨水排水設備工																																		
建築施設整備工	トイレ・防災倉庫基礎												生コン打設																					
	鉄筋・型枠組立												V=35m3																					
付帯工													東側町道																					
													舗装撤去A=50.4m2,集水樹4基,VUΦ100 24m																					
管理施設整備工																																		
搬入予定																																		

25.8%

3.2%

71.0%


先月迄出来高

今月出来高

未施工出来高

	先月迄出来高	71.0%
	今月出来高	3.2%
	未施工出来高	25.8%

【 今月の作業内容 】

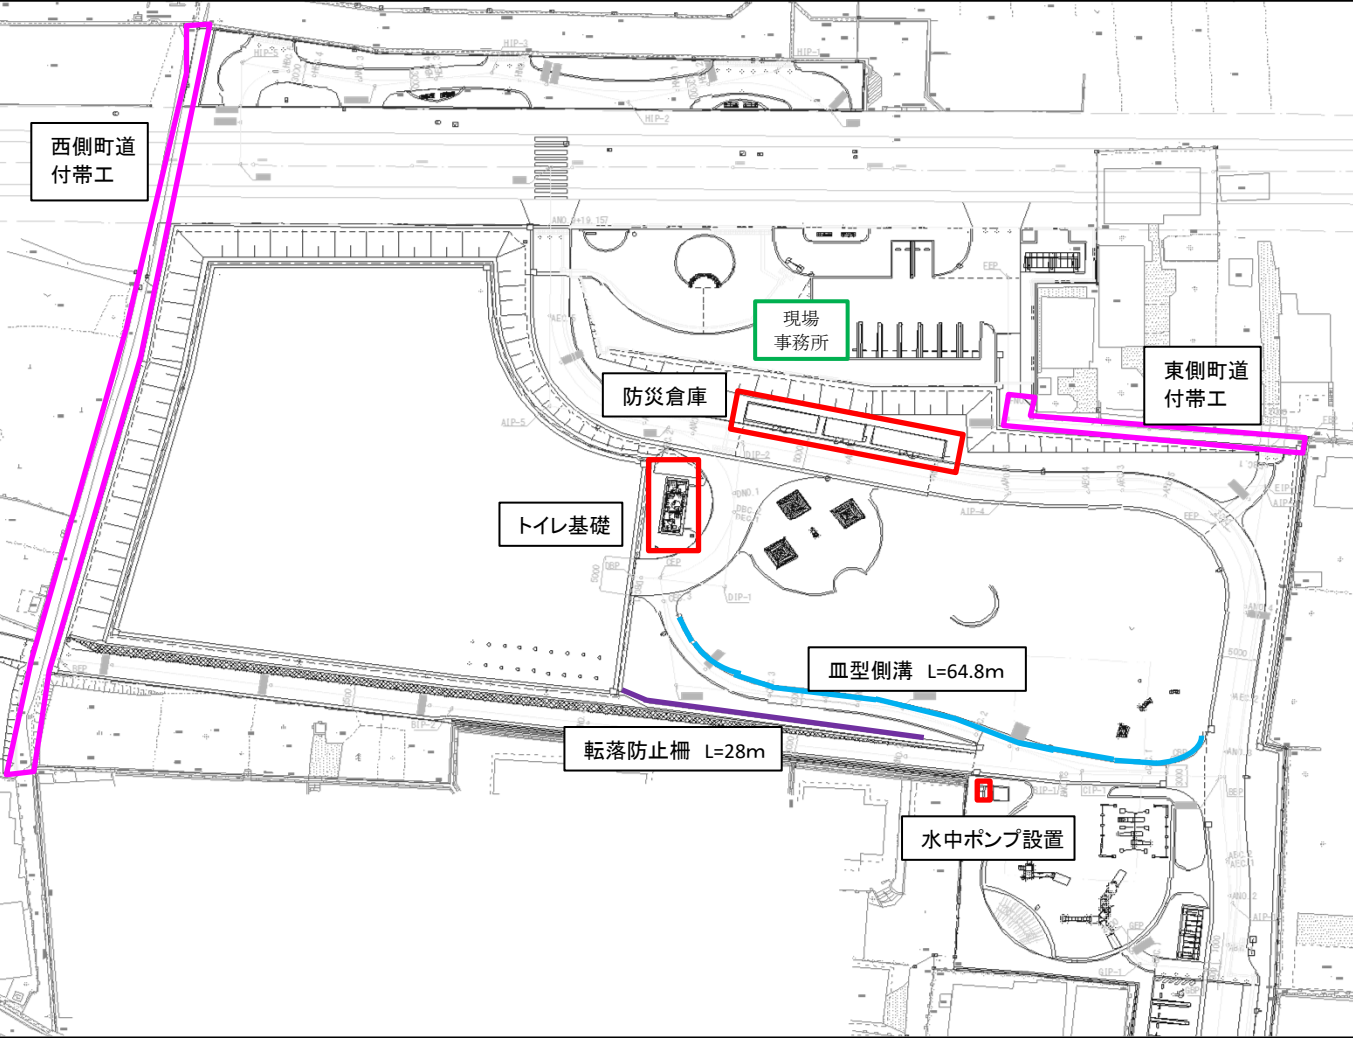

【 大型車両搬入ルート 】

