


月間工事工程表 R8.8月版	工事名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工事場所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			工 種	令和 8 年 8 月																															備 考						
				1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月							
■先月迄出来高 ■今月出来高 □未施工出来高 <table><tr><td>先月迄出来高</td><td>75.0%</td></tr><tr><td>今月出来高</td><td>5.5%</td></tr><tr><td>未施工出来高</td><td>19.5%</td></tr></table>			先月迄出来高	75.0%	今月出来高	5.5%	未施工出来高	19.5%	園路広場整備工																遊具広場 桧皮舗装																
			先月迄出来高	75.0%																																					
			今月出来高	5.5%																																					
			未施工出来高	19.5%																																					
																								</																	

【 今月の作業内容 】

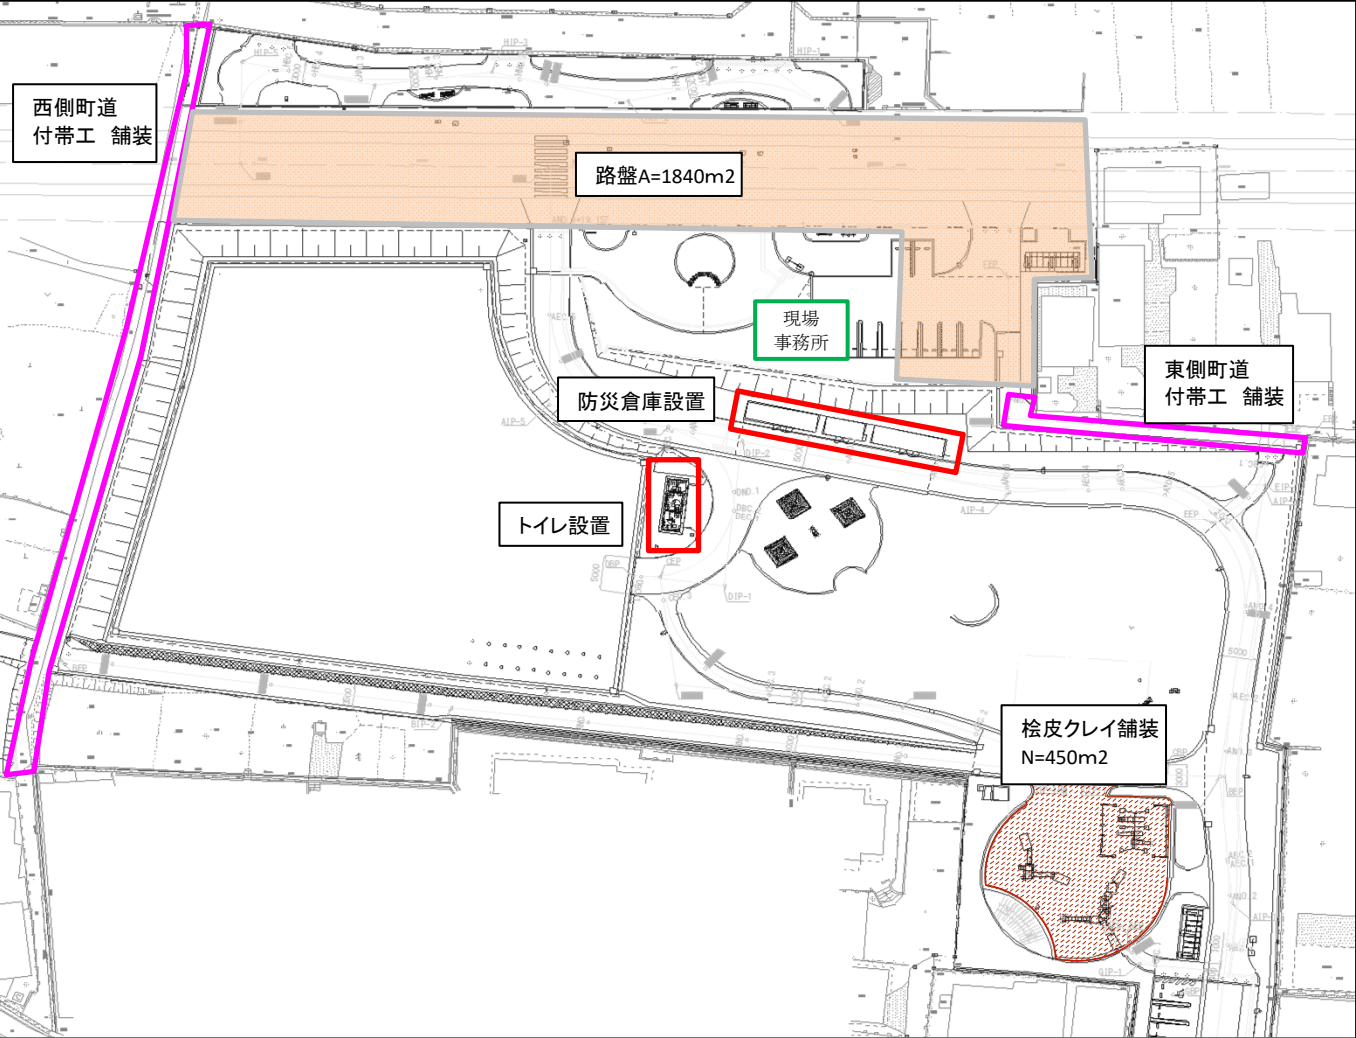

【 大型車両搬入ルート 】

