


月 間 工 事 工 程 表 R8.9月 版	工 事 名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工 事 場 所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			令和 8 年 9 月																														備 考													
			1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水														
先月迄出来高 80.5% 今月出来高 7.5% 未施工出来高 12.0%			園路広場整備工				トイレ・四阿周り縁石				南出入口縁石				園路路盤																															
			L=96m								L=41.2m								A=150m2+212m2																											
			擁壁工																雑割石積み																											
																			N=78個																											
			雨水排水設備工																								可変側溝L=47.2m																			
			建築施設整備工				四阿基礎N=3基								四阿設置N=3基								自転車置場基礎																							
			サービス施設整備工				水飲み設置N=1基								時計塔設置N=1基																															
			管理施設整備工																																											
			搬入予定																																											

【 今月の作業内容 】

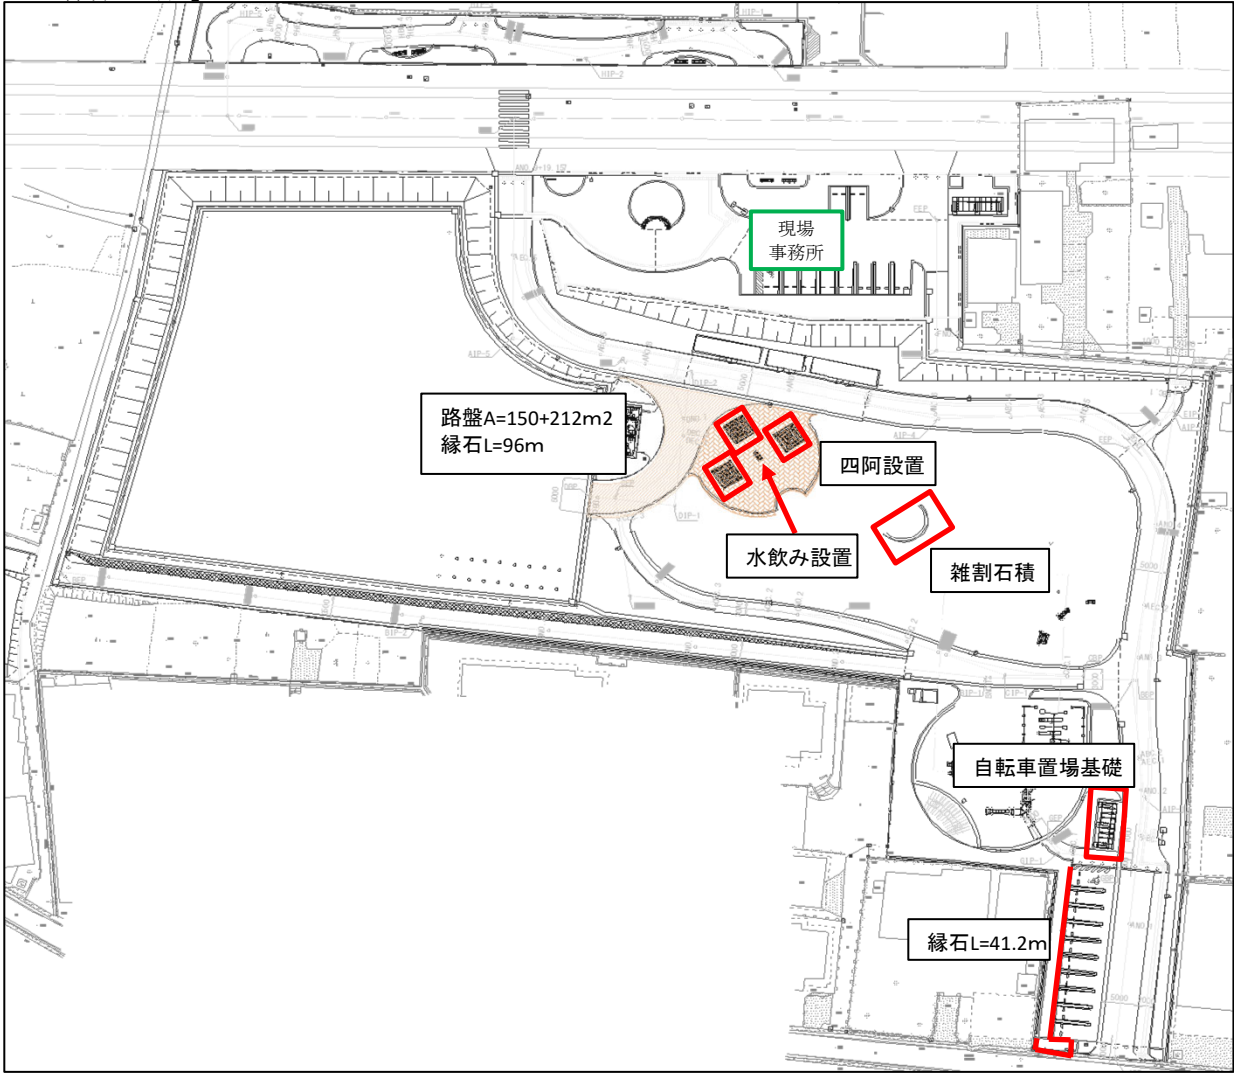

【 大型車両搬入ルート 】

