


月 間 工 事 工 程 表 R8.1月 版	工 事 名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工 事 場 所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9 年 3 月 10 日				

全体工事進捗状況			令和 8 年 1 月																															備考											
			工 種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土											
<div><div><div></div><div>38.5%</div></div><div><div></div><div>59.0%</div></div><div><div></div><div>2.5%</div></div></div> <div>■先月迄出来高 ■今月出来高 □未施工出来高</div> <table><tr><td></td><td>先月迄出来高</td><td>59.0%</td></tr><tr><td></td><td>今月出来高</td><td>2.5%</td></tr><tr><td></td><td>未施工出来高</td><td>38.5%</td></tr></table>				先月迄出来高	59.0%		今月出来高	2.5%		未施工出来高	38.5%	雨水排水設備工																																	
				先月迄出来高	59.0%																																								
				今月出来高	2.5%																																								
				未施工出来高	38.5%																																								
			管理施設整備工 (フェンス)																																										
園路広場整備工																																													
			給水設備工	年末年始休暇 12/27～1/4																																									
			仮設工																																										
			その他																																										
			大型車両搬出入																																										

【 今月の作業内容 】

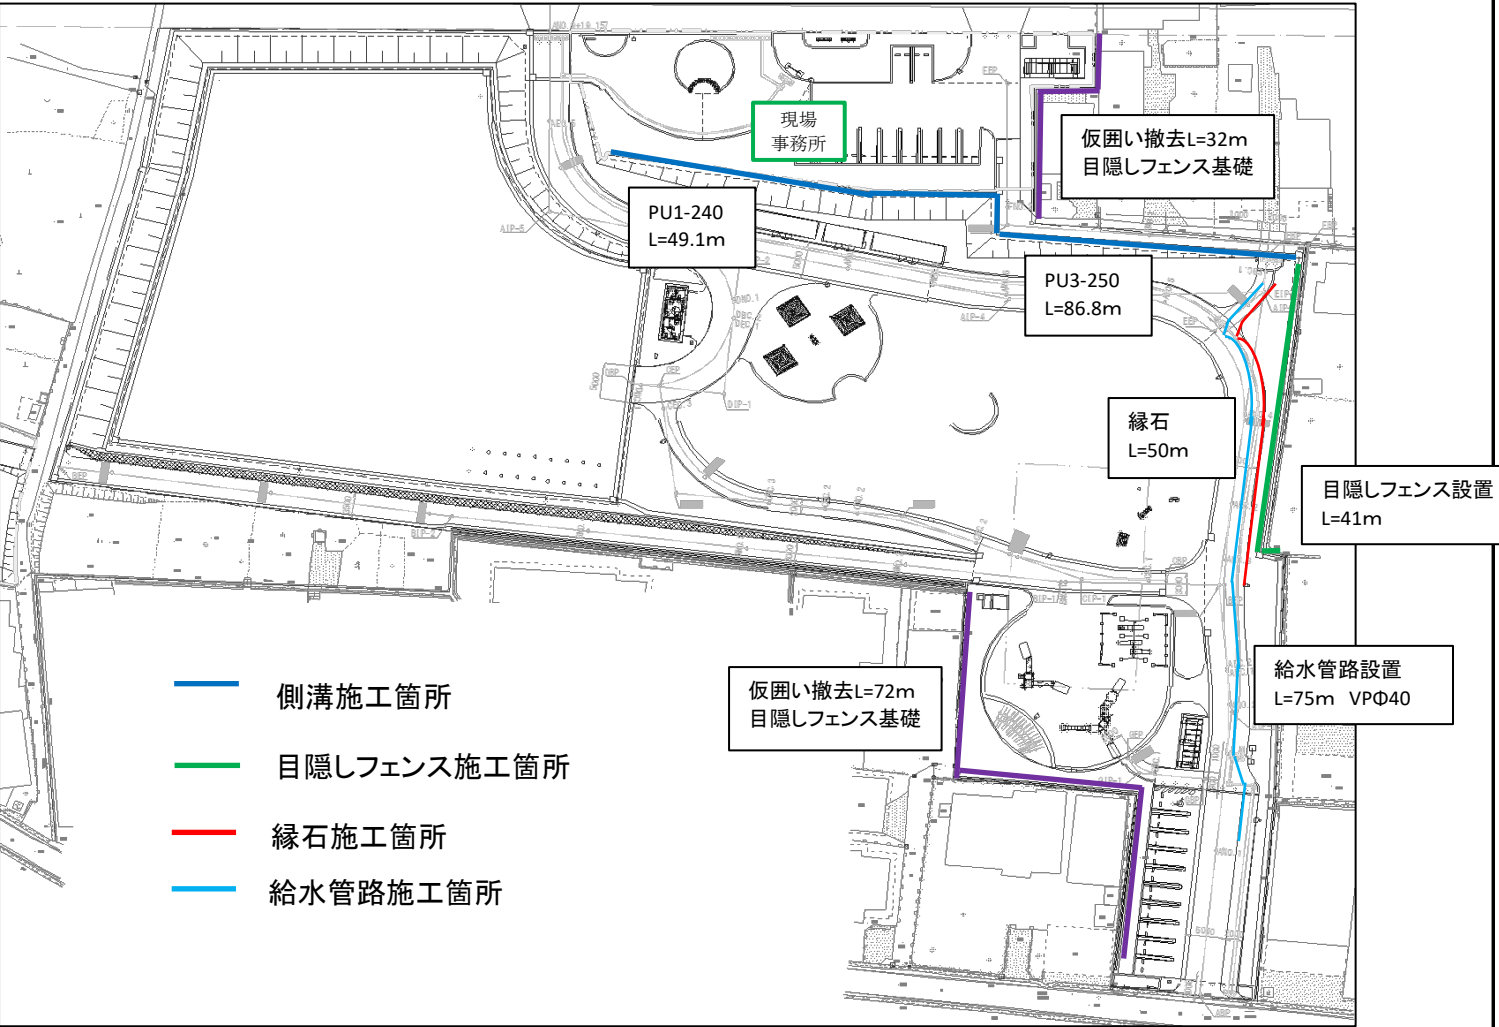

【 大型車両搬入ルート 】

