月間工事工程表 R7.7月 版	工事名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6年 6月 25日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工事場所	海部郡大治町大字砂子地内		令和 9年 3月 10日				

全体工事進捗状況



先月迄出来高	48.0%
今月出来高	1.0%
未施工出来高	51.0%

令和 7年 7月

工種	1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	備考
雨水排水設備工																												側溝				
園路広場整備工																						路盤工	砕石敷均し									
仮設工																																
その他	盛土圧密沈下測量中 →																															
大型車両搬出入																							10tダンプ 30台 砕石	30台 砕石								

【 今月の作業内容 】
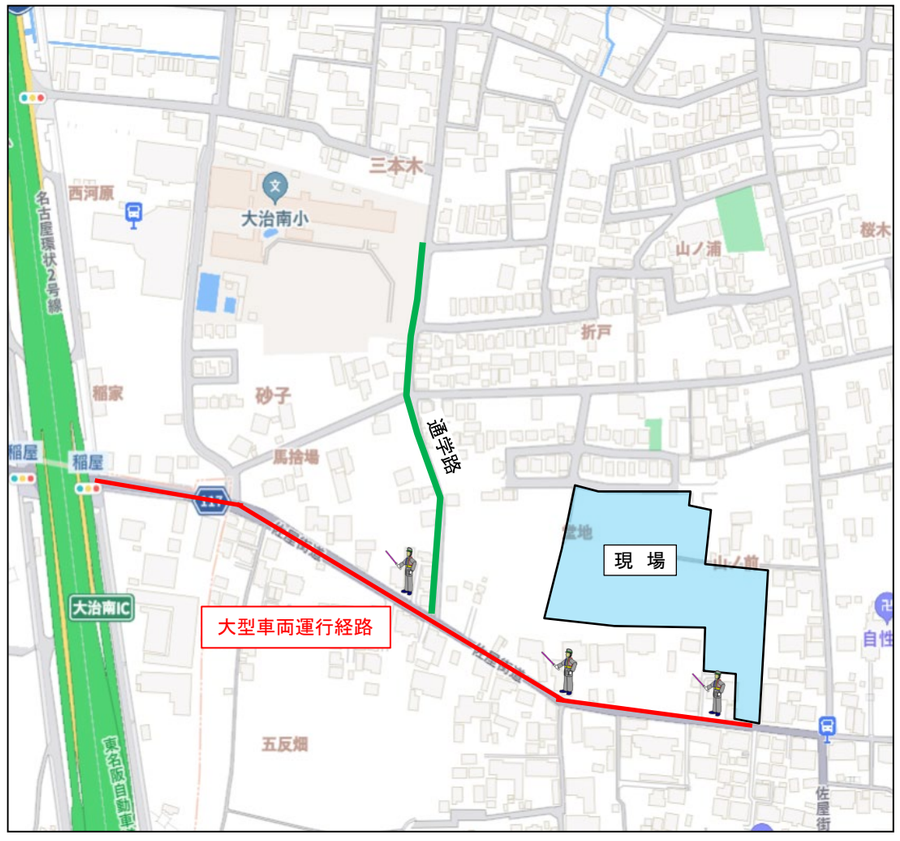
【 大型車両搬入ルート 】
