
月間工事工程表 R8.11月 版	工事名	砂子防災公園新設工事(週休2日)	全体工期	令和 6 年 6 月 25 日 令和 9 年 3 月 10 日	発注者	大治町役場 建設部都市整備課	施工者	株式会社 加藤建設
	工事場所	海部郡大治町大字砂子地内						


全体工事進捗状況



	先月迄出来高	90.5%
	今月出来高	1.0%
	未施工出来高	8.5%

工種	令和 8 年 11 月																													備考
	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	
園路広場整備工												地先境界ブロック L=40m																		
擁壁工																		雑割石積みN=78個												
雨水排水設備工		可変側溝 L=47.2m															PU250側溝 L=4.6+4.2m													
建築施設整備工		自転車置場基礎														自転車置場土間コン A=25.9m2														
管理施設整備工 遊戯施設組立設置工												車止め基礎 N=55個				健康遊具設置 N=3基														
舗装工																							路盤不陸整正 透水性ブロック舗装A＝293m2								
搬入予定																														

【 今月の作業内容 】

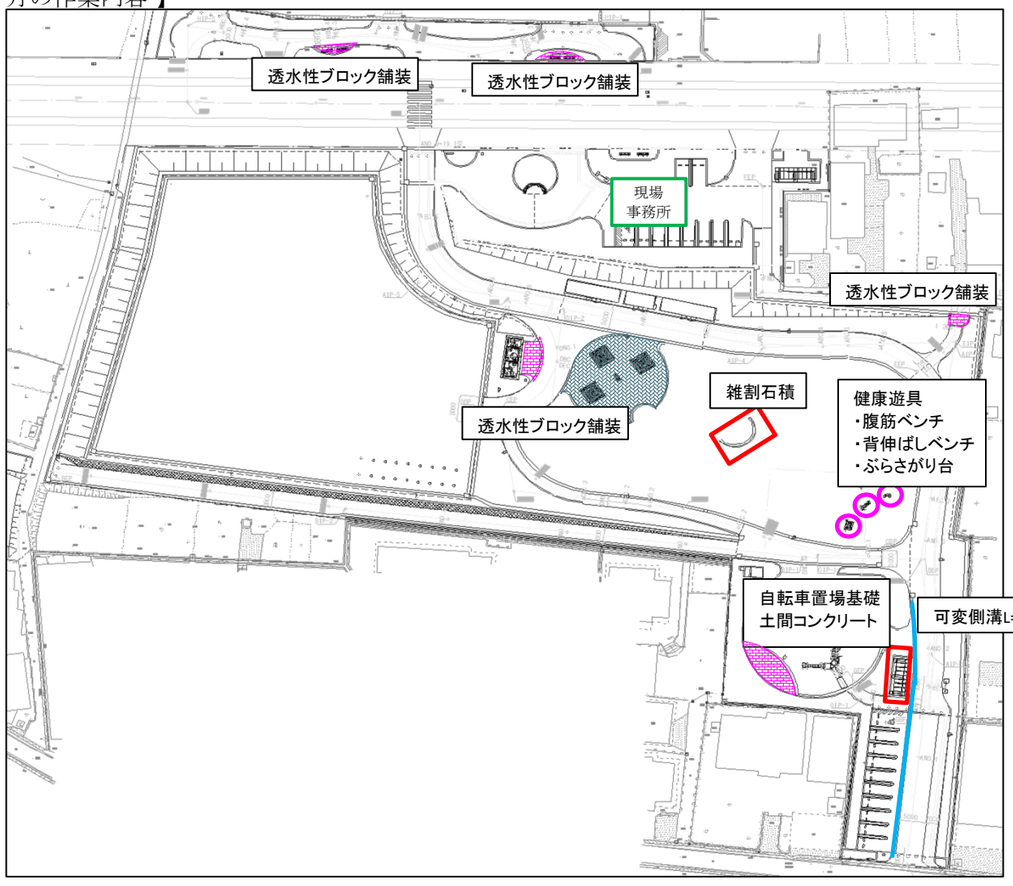

【 大型車両搬入ルート 】

